PERIMETRO URBANO DE CORREIA PINTO

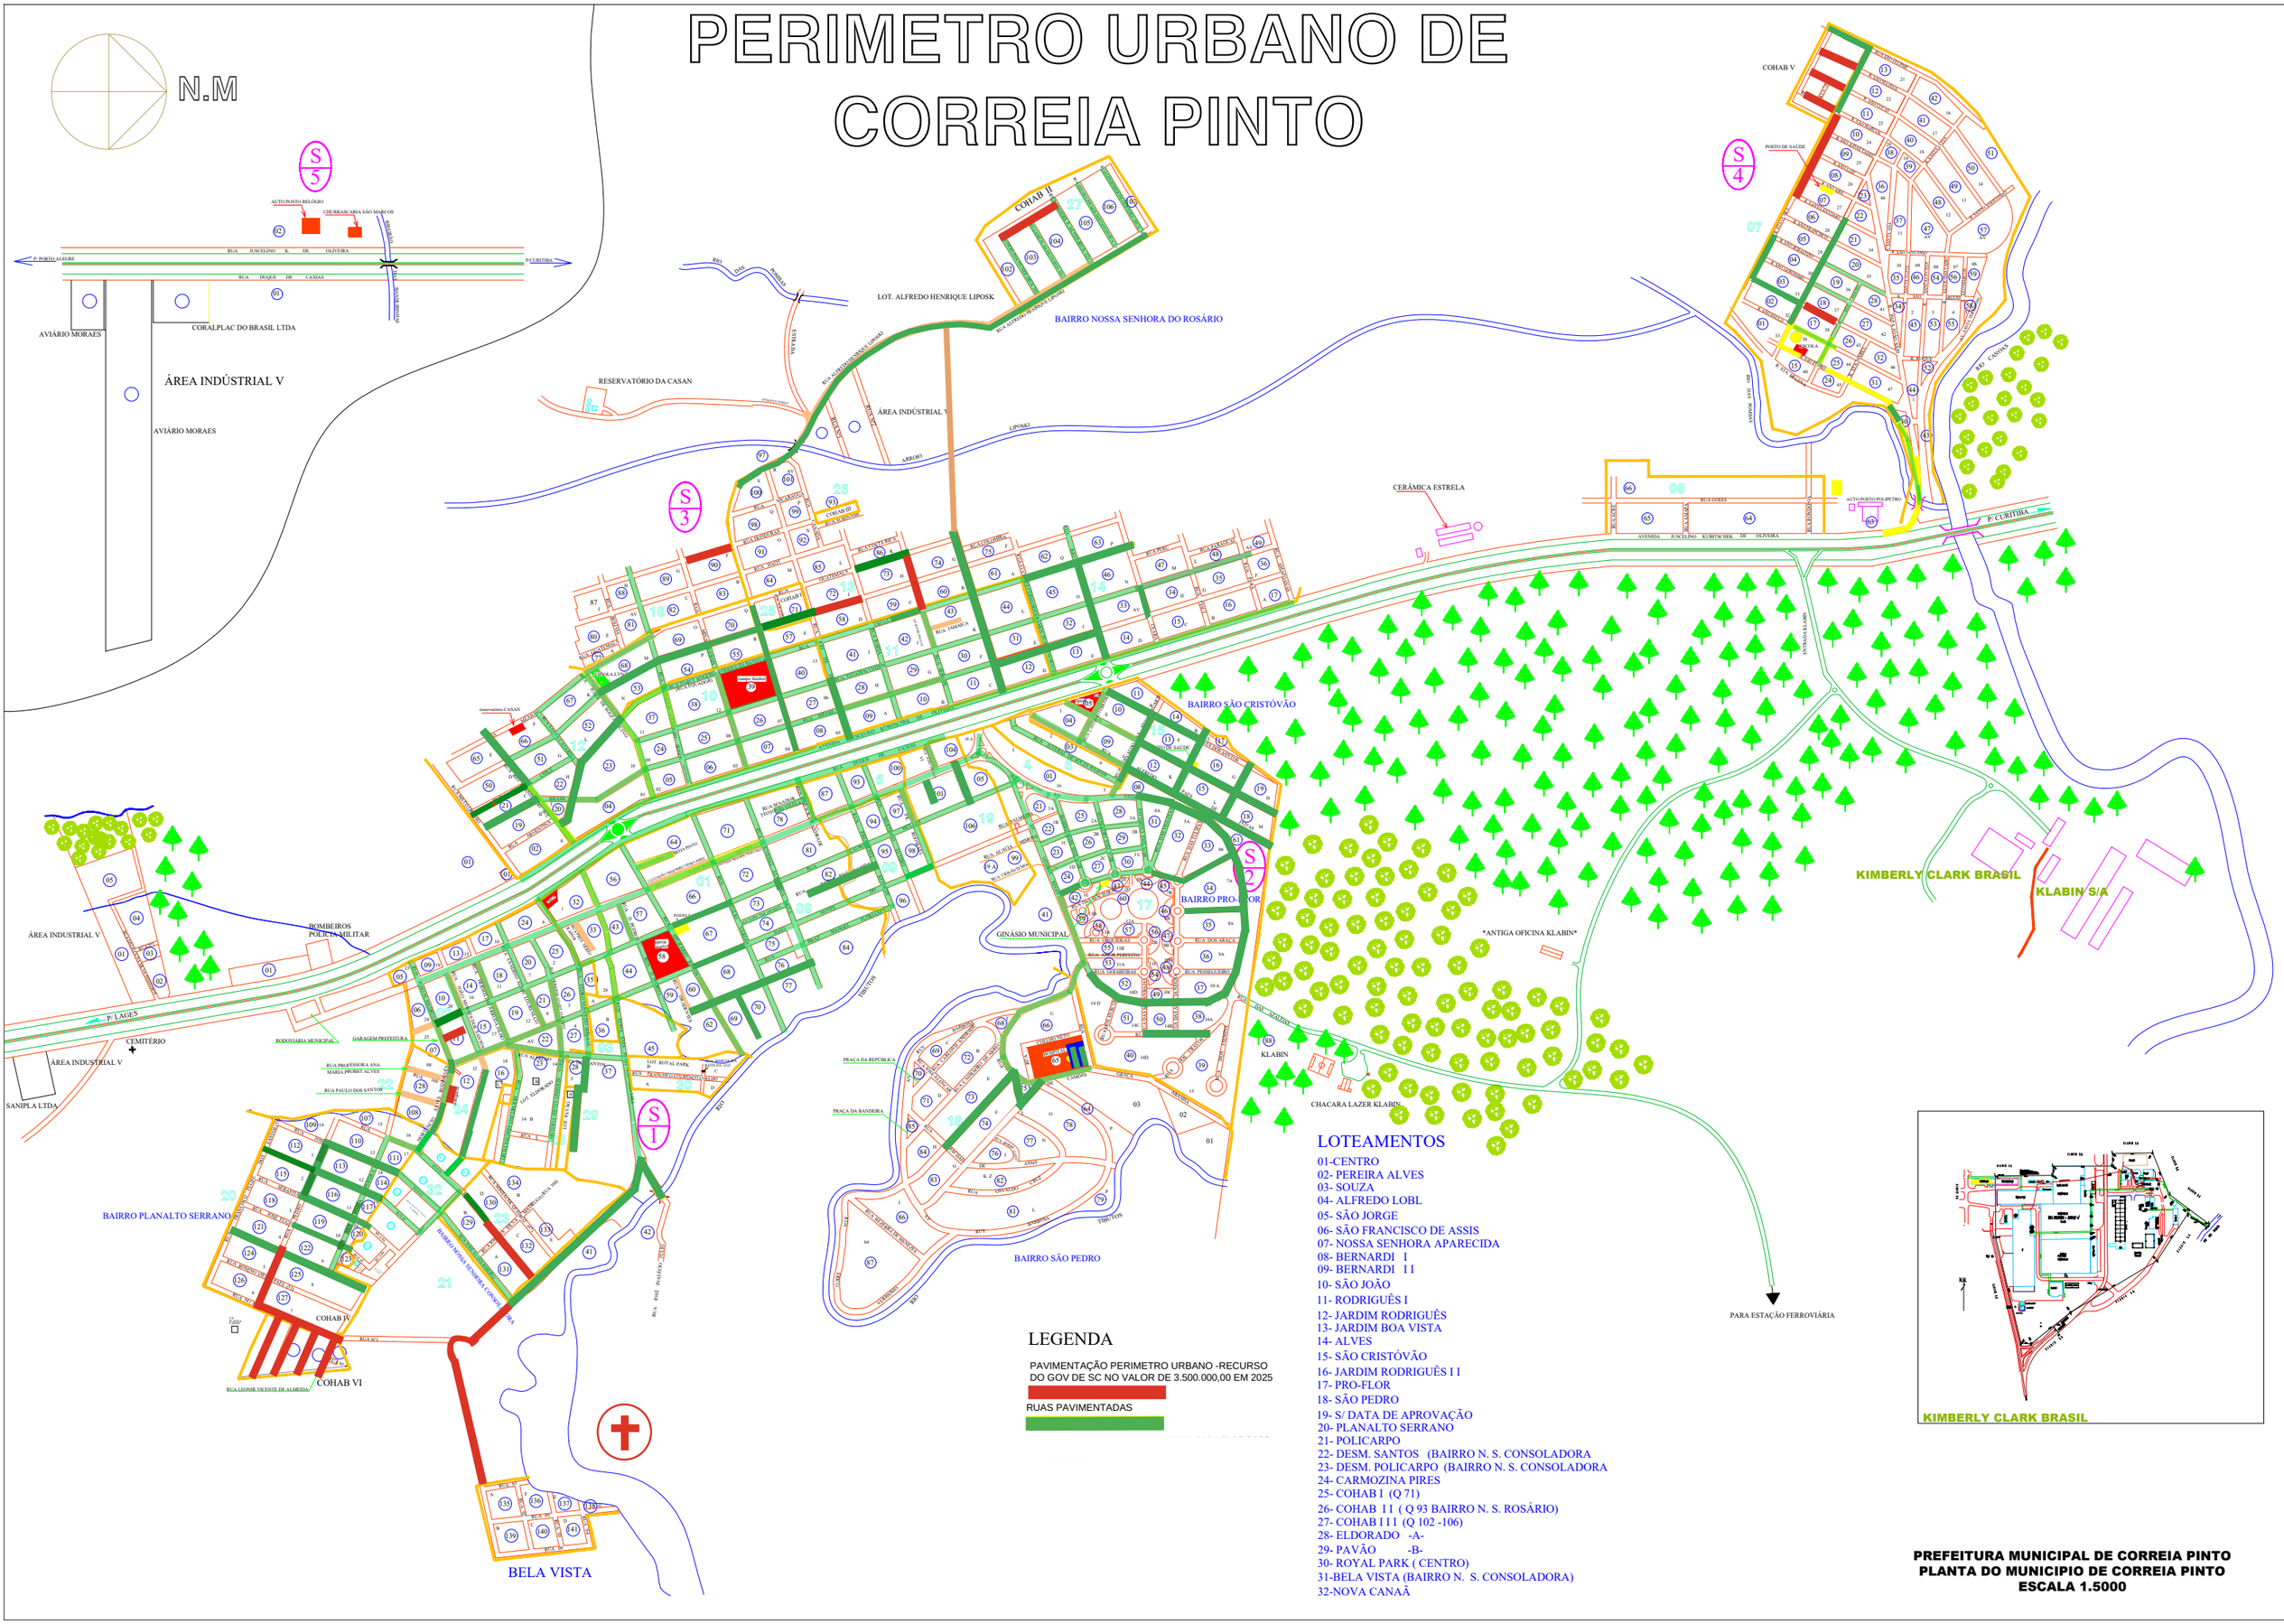

LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO -RECURSO DO GOV DE SC NO VALOR DE 3.500.000,00 EM 2025

RUAS PAVIMENTADAS

LOTEAMENTOS

01-CENTRO
02- PEREIRA ALVES
03- SOUZA
04- ALFREDO LOBL
05- SÃO JORGE
06- SÃO FRANCISCO DE ASSIS
07- NOSSA SENHORA APARECIDA
08- BERNARDI I
09- BERNARDI I I
10- SÃO JOÃO
11- RODRIGUÊS I
12- JARDIM RODRIGUÊS
13- JARDIM BOA VISTA
14- ALVES
15- SÃO CRISTÓVÃO
16- JARDIM RODRIGUÊS I I
17- PRO-FLOR
18- SÃO PEDRO
19- S/ DATA DE APROVAÇÃO
20- PLANALTO SERRANO
21- POLICARPO
22- DESM. SANTOS (BAIRRO N. S. CONSOLADORA
23- DESM. POLICARPO (BAIRRO N. S. CONSOLADORA
24- CARMOZINA PIRES
25- COHAB I (Q 71)
26- COHAB I I (Q 93 BAIRRO N. S. ROSÁRIO)
27- COHAB I I I (Q 102 -106)
28- ELDORADO -A-
29- PAVÃO -B-
30- ROYAL PARK (CENTRO)
31-BELA VISTA (BAIRRO N. S. CONSOLADORA)
32-NOVA CANAÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
PLANTA DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO
ESCALA 1.5000

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNIPAL DE CORREIA PINTO
Município/UF:	CORREIA PINTO
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R$):	3.500.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R$):	982.923,43
% mínimo de Contrapartida:	
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	08-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU:	026768-0
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	10/11/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	LUCIA RAQUEL RODRIGUES ORTIZ
Cargo:	PREFEITA

Arredondamento das frentes:	Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
Profissão:	ENG. CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	026768-0
ART/RRT (para obras/projetos):	

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNIPAL DE CORREIA PINTO	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (DES.)	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO	CORREIA PINTO	24,46%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO									**4.482.923,43**	
1.			**PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO**					**-**	**4.482.923,43**	
1.1.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANTONIO DANIEL TRECHO N 02**					**-**	**304.961,17**	
1.1.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANTONIO DANIEL TRECHO N 02	m2	1.593,26	153,79	BDI 1	191,41	304.961,17	RA
1.2.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ESTACIONAMENTO CENTRO DE EVENTOS**					**-**	**269.937,18**	
1.2.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ESTACIONAMENTO CENTRO DE EVENTOS	m2	1.846,63	117,45	BDI 1	146,18	269.937,18	RA
1.3.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOSE VALDIR PEREIRA**					**-**	**174.449,11**	
1.3.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOSE VALDIR PEREIRA	m2	1.168,04	120,00	BDI 1	149,35	174.449,11	RA
1.4.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PEDRO RODRIGUES BASTOS**					**-**	**252.491,35**	
1.4.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PEDRO RODRIGUES BASTOS	m2	1.252,59	161,96	BDI 1	201,58	252.491,35	RA
1.5.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA A BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA COHAB**					**-**	**134.448,57**	
1.5.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA A BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA COHAB	m2	879,83	122,78	BDI 1	152,81	134.448,57	RA
1.6.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA B BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA COHAB**					**-**	**128.781,97**	
1.6.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA B BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA COHAB	m2	795,27	130,11	BDI 1	161,93	128.781,97	RA
1.7.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA C BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA COHAB**					**-**	**138.122,56**	
1.7.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA C BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA COHAB	m2	927,44	119,66	BDI 1	148,93	138.122,56	RA
1.8.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA HONDURAS**					**-**	**193.469,86**	
1.8.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA HONDURAS	m2	950,40	163,56	BDI 1	203,57	193.469,86	RA
1.9.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOAO MARIA DOS SANTOS**					**-**	**423.797,75**	
1.9.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOAO MARIA DOS SANTOS	m2	2.133,65	159,59	BDI 1	198,63	423.797,75	RA
1.10.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA LEONIR VICENTE DE ALMEIDA**					**-**	**66.584,78**	
1.10.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA LEONIR VICENTE DE ALMEIDA	m2	374,04	143,03	BDI 1	178,02	66.584,78	RA
1.11.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PAULO ROBERTO SCHEREDER**					**-**	**123.556,71**	
1.11.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PAULO ROBERTO SCHEREDER	m2	826,39	120,13	BDI 1	149,51	123.556,71	RA
1.12.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SEBASTIAO LUIZ DUARTE**					**-**	**133.501,56**	
1.12.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SEBASTIAO LUIZ DUARTE	m2	849,15	126,32	BDI 1	157,22	133.501,56	RA
1.13.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SERGIPE**					**-**	**338.697,34**	
1.13.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SERGIPE	m2	1.741,32	156,28	BDI 1	194,51	338.697,34	RA
1.14.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SÃO GABRIEL**					**-**	**184.423,56**	
1.14.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SÃO GABRIEL	m2	885,92	167,26	BDI 1	208,17	184.423,56	RA
1.15.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SANTA CLARA**					**-**	**278.977,59**	
1.15.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SANTA CLARA	M2	1.440,00	155,66	BDI 1	193,73	278.977,59	RA
1.16.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 175 COHAB II**					**-**	**94.561,03**	
1.16.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 175 COHAB II	M2	585,61	129,74	BDI 1	161,47	94.561,03	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNIPAL DE CORREIA PINTO	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (DES.)	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO	CORREIA PINTO	24,46%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO									**4.482.923,43**	
1.17.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA VENEZUELA TRECHO N 04**					**-**	**200.334,80**	
1.17.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA VENEZUELA TRECHO N 04	M2	960,00	167,67	BDI 1	208,68	200.334,80	RA
1.18.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA MORRO DA CRUZ**					**-**	**472.651,05**	
1.18.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA MORRO DA CRUZ	M2	2.535,80	149,76	BDI 1	186,39	472.651,05	RA
1.19.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CEZENANDO**					**-**	**369.223,04**	
1.19.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ORVALINO MAZIEIRO	M2	2.000,00	148,33	BDI 1	184,61	369.223,04	RA
1.20.			**PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CARLOS GOMES**					**-**	**199.952,46**	
1.20.1.	SINAPI		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CARLOS GOMES	M2	1.200,00	133,88	BDI 1	166,63	199.952,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

segunda-feira, 10 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNIPAL DE CORREI	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO U	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO M

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 I**	**4.482.923,43**	% Período:	7,60%	7,60%	10,14%	6,36%	6,36%	8,48%	7,09%	7,09%	9,45%	8,95%	8,95%	11,93%
1.1.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA AI	304.961,17	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.2.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ES	269.937,18	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JO	174.449,11	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.4.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PI	252.491,35	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA A	134.448,57	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.6.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA B	128.781,97	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
							30,00%	30,00%	40,00%						
1.7.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA C	138.122,56	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
							30,00%	30,00%	40,00%						
1.8.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA HO	193.469,86	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
							30,00%	30,00%	40,00%						
1.9.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JO	423.797,75	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
							30,00%	30,00%	40,00%						
1.10.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA LE	66.584,78	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
							30,00%	30,00%	40,00%						
1.11.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PA	123.556,71	% Período:							30,00%	30,00%	40,00%			
										30,00%	30,00%	40,00%			
1.12.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SI	133.501,56	% Período:							30,00%	30,00%	40,00%			
										30,00%	30,00%	40,00%			
1.13.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SI	338.697,34	% Período:							30,00%	30,00%	40,00%			
										30,00%	30,00%	40,00%			
1.14.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SA	184.423,56	% Período:							30,00%	30,00%	40,00%			
										30,00%	30,00%	40,00%			
1.15.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SA	278.977,59	% Período:							30,00%	30,00%	40,00%			
										30,00%	30,00%	40,00%			
1.16.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 17	94.561,03	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
													30,00%	30,00%	40,00%
1.17.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA VI	200.334,80	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
													30,00%	30,00%	40,00%
1.18.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA M	472.651,05	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
													30,00%	30,00%	40,00%
1.19.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CI	369.223,04	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
													30,00%	30,00%	40,00%
1.20.	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA CA	199.952,46	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
													30,00%	30,00%	40,00%

Total: R$ 4.482.923,43

Período:												
	%:	7,60%	7,60%	10,14%	6,36%	6,36%	8,48%	7,09%	7,09%	9,45%	8,95%	8,95%	11,93%
	Repasse:	266.143,68	266.143,69	354.858,24	222.688,34	222.688,34	296.917,79	248.077,98	248.077,98	330.770,64	313.089,99	313.090,00	417.453,33
	Contrapartida:	74.742,53	74.742,53	99.656,71	62.538,74	62.538,74	83.384,99	69.669,04	69.669,05	92.892,06	87.926,71	87.926,71	117.235,62
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**340.886,21**	**340.886,22**	**454.514,95**	**285.227,08**	**285.227,08**	**380.302,77**	**317.747,03**	**317.747,02**	**423.662,70**	**401.016,71**	**401.016,71**	**534.688,95**

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNIPAL DE CORREIA	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO U	PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO M

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
			%:	7,60%	15,21%	25,35%	31,71%	38,07%	46,56%	53,64%	60,73%	70,18%	79,13%	88,07%	100,00%
			Repasse:	266.143,68	532.287,37	887.145,61	1.109.833,95	1.332.522,29	1.629.440,08	1.877.518,06	2.125.596,04	2.456.366,68	2.769.456,67	3.082.546,67	3.500.000,00
		Acumulado:	Contrapartida:	74.742,53	149.485,06	249.141,77	311.680,51	374.219,25	457.604,24	527.273,28	596.942,33	689.834,39	777.761,10	865.687,81	982.923,43
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	**340.886,21**	**681.772,43**	**1.136.287,38**	**1.421.514,46**	**1.706.741,54**	**2.087.044,31**	**2.404.791,34**	**2.722.538,36**	**3.146.201,06**	**3.547.217,77**	**3.948.234,48**	**4.482.923,43**

CORREIA PINTO
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT:

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNIPAL DE CORREIA PINTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO / PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	5,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,50%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,62%
BDI COM desoneração	BDI DES	**24,46%**

– Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO
Local

segunda-feira, 10 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

CAIXA **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
0	0	PREFEITURA MUNIPAL DE CORREIA PINTO	CORREIA PINTO			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO			(SELECIONAR)	3.500.000,00	982.923,43	4.482.923,43

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.			PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA DAS 20 RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNIPICIO		20,00		LOTE 1	3.500.000,00	982.923,43	-	4.482.923,43
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	**3.500.000,00** (78,07%)	**982.923,43** (21,93%)	**-** (0,00%)	**4.482.923,43** (100,00%)

Observações:

CORREIA PINTO
Local

segunda-feira, 10 de novembro de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: LUCIA RAQUEL RODRIGUES ORTIZ
Cargo: PREFEITA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2025 **10267313-3**
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
Título Profissional: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
RNP: 2500705781
Registro: 026768-0-SC

Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
Endereço: DUQUE DE CAXIAS
Nº: 0
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: CORREIA PINTO
UF: SC
CEP: 88535-000
Valor: R$ 5.000,00
Ação Institucional:
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
Endereço: DIVERSOS
Nº: 0
Complemento:
Bairro: DIVERSOS
Cidade: CORREIA PINTO
UF: SC
CEP: 88535-000
Data de Início: 14/12/2025
Previsão de Término: 14/12/2027
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:

4. Atividade Técnica

Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Drenagem				
		Dimensão do Trabalho:	960,13	Metro(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Boca de Lobo				
		Dimensão do Trabalho:	64,00	Unidade(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Pavimentação Asfáltica				
		Dimensão do Trabalho:	9.194,60	Metro(s) Quadrado(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Meio Fio				
		Dimensão do Trabalho:	1.936,79	Metro(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Sinalização				
		Dimensão do Trabalho:	27,00	Unidade(s)

5. Observações

PAV. ASFALTICA NAS RUAS: ESTAC. DO CENTRO DE EVEN; ANTONIO DANIEL; JOAO MARIA DOS SANTOS; LEONIR VICENTE DE ALMEIDA; PAULO ROBERTO SCHEREDER; JOSE VALDIR PEREIRA; PEDRO RODRIGUES BASTOS;

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEA - 4

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 14/12/2025: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R$ 103,03 | Data Vencimento: 24/12/2025 | Registrada em: 14/12/2025
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002504000583012

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

LAGES - SC, 14 de Dezembro de 2025

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953
Assinado de forma digital por EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
513.918.569-53

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2025 **10267314-1**
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
Título Profissional: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
RNP: 2500705781
Registro: 026768-0-SC

Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
Endereço: DUQUE DE CAXIAS
Nº: 0
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: CORREIA PINTO
UF: SC
CEP: 88535-000
Valor: R$ 5.000,00
Ação Institucional:
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
Endereço: DIVERSOS
Nº: 0
Complemento:
Bairro: DIVERSOS
Cidade: CORREIA PINTO
UF: SC
CEP: 88535-000
Data de Início: 14/12/2025
Previsão de Término: 14/02/2027
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:

4. Atividade Técnica

Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Drenagem				
	Dimensão do Trabalho:		1.015,87	Metro(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Boca de Lobo				
	Dimensão do Trabalho:		56,00	Unidade(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Pavimentação Asfáltica				
	Dimensão do Trabalho:		6.500,87	Metro(s) Quadrado(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Meio Fio				
	Dimensão do Trabalho:		1.939,62	Metro(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Sinalização				
	Dimensão do Trabalho:		24,00	Unidade(s)

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: ORVALINO MAZIEIRO; SEBASTIÃO LUIZ DUARTE; SERGIPE; VENEZUELA; HONDURAS; NO PERÍMETRO URBANO DE CORREIA PINTO.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEA - 4

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 14/12/2025: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R$ 103,03 | Data Vencimento: 24/12/2025 | Registrada em: 14/12/2025
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002504000583013

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

LAGES - SC, 14 de Dezembro de 2025

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953
Assinado de forma digital por EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
513.918.569-53

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Descrição de débitos

- **PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO**
- **PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO**
- **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO**
- **CNPJ CONTRATANTE: 75.438.655/0001-45**
- **LOCALIZACAO: DIVERSOS 0**
- **CIDADE: CORREIA PINTO SC**
- **ART: 10267313-3 CREA-SC: 026768-0**

Linha digitável

10490 51152 95002 150449 00058 301243 1 13050000010303

CREA-SC | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Cedente: CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC				Vencimento: **24/12/2025**
Nosso Número: 140025040005830126	Número do Documento: 4102673133	Espécie Doc.: GUIA	Data Documento: 14/12/2025	Agência / Cod. Cedente: 1011 / 051159-5
(=) Valor Documento: **103,03**	(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (CPF 513.918.569-53)

Autenticação Mecânica

CAIXA | **104-0** | **10490.51152 95002.150449 00058.301243 1 13050000010303**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: **24/12/2025**
Cedente: CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)					Agência / Cod. Cedente: 1011 / 051159-5
Data Documento: 14/12/2025	Número do Documento: 4102673133	Espécie Doc.: GUIA	Aceite: N	Data Processamento: 14/12/2025	Nosso Número: 140025040005830126
Uso do Banco	Carteira: RG	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento: **103,03**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Data/Hora Geração Boleto: 14/12/2025 10:35:01

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (CPF 513.918.569-53)
RUA ANTONIO CORREIA PINTO, 542, AP 301 - CENTRO - CORREIA PINTO - SC CEP: 88535000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2025 **10274612-5**
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
Título Profissional: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
RNP: 2500705781
Registro: 026768-0-SC

Empresa Contratada:
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
Endereço: DUQUE DE CAXIAS
Nº: 0
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: CORREIA PINTO
UF: SC
CEP: 88535-000
Valor: R$ 5.000,00
Ação Institucional:
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
Endereço: DIVERSAS
Nº: 0
Complemento:
Bairro: DIVERSOS
Cidade: CORREIA PINTO
UF: SC
CEP: 88535-000
Data de Início: 17/12/2025
Previsão de Término: 17/12/2027
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:

4. Atividade Técnica

Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Drenagem				
		Dimensão do Trabalho:	937,03	Metro(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Boca de Lobo				
		Dimensão do Trabalho:	66,00	Unidade(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Pavimentação Asfáltica				
		Dimensão do Trabalho:	9.249,87	Metro(s) Quadrado(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Meio Fio				
		Dimensão do Trabalho:	2.770,98	Metro(s)
Orçamento	Projeto	Fiscalização		
Sinalização				
		Dimensão do Trabalho:	30,00	Unidade(s)

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: A, B e C NO BAIRRO NOSSA SRA APAREC; SANTA CLARA; SÃO GABRIEL; 17S NA COHAB II; MORRO DA CRUZ; E CARLOS GOMES. TODAS NO PERÍMETRO URBANO DE CORREIA PINTO.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEA - 4

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 17/12/2025: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R$ 103,03 | Data Vencimento: 29/12/2025 | Registrada em: 17/12/2025
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002504000590526

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

LAGES - SC, 17 de Dezembro de 2025

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953
Assinado de forma digital por EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
513.918.569-53

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Descrição de débitos

- **PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO**
- **PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO**
- **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO**
- **CNPJ CONTRATANTE: 75.438.655/0001-45**
- **LOCALIZACAO: DIVERSOS 0**
- **CIDADE: CORREIA PINTO SC**
- **ART: 10267314-1 CREA-SC: 026768-0**

Linha digitável

10490 51152 95002 150449 00058 301326 1 13050000010303

CREA-SC | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Cedente: CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC				Vencimento: **24/12/2025**
Nosso Número: 140025040005830134	Número do Documento: 4102673141	Espécie Doc.: GUIA	Data Documento: 14/12/2025	Agência / Cod. Cedente: 1011 / 051159-5
(=) Valor Documento: **103,03**	(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (CPF 513.918.569-53)

Autenticação Mecânica

CAIXA | **104-0** | **10490.51152 95002.150449 00058.301326 1 13050000010303**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: **24/12/2025**
Cedente: CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)					Agência / Cod. Cedente: 1011 / 051159-5
Data Documento: 14/12/2025	Número do Documento: 4102673141	Espécie Doc.: GUIA	Aceite: N	Data Processamento: 14/12/2025	Nosso Número: 140025040005830134
Uso do Banco	Carteira: RG	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento: **103,03**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Data/Hora Geração Boleto: 14/12/2025 10:44:24

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (CPF 513.918.569-53)
RUA ANTONIO CORREIA PINTO, 542, AP 301 - CENTRO - CORREIA PINTO - SC CEP: 88535000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Descrição de débitos

- **PROFISSIONAL EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO**
- **PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO**
- **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO**
- **CNPJ CONTRATANTE: 75.438.655/0001-45**
- **LOCALIZACAO: DIVERSAS 0**
- **CIDADE: CORREIA PINTO SC**
- **ART: 10274612-5 CREA-SC: 026768-0**

Linha digitável

10490 51152 95002 150449 00059 052647 1 13100000010303

CREA-SC | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Cedente: CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC				Vencimento: **29/12/2025**
Nosso Número: 140025040005905266	Número do Documento: 4102746125	Espécie Doc.: GUIA	Data Documento: 17/12/2025	Agência / Cod. Cedente: 1011 / 051159-5
(=) Valor Documento: **103,03**	(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (CPF 513.918.569-53)

Autenticação Mecânica

CAIXA | **104-0** | **10490.51152 95002.150449 00059.052647 1 13100000010303**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: **29/12/2025**
Cedente: CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)					Agência / Cod. Cedente: 1011 / 051159-5
Data Documento: 17/12/2025	Número do Documento: 4102746125	Espécie Doc.: GUIA	Aceite: N	Data Processamento: 17/12/2025	Nosso Número: 140025040005905266
Uso do Banco	Carteira: RG	Esp. Moeda: R$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento: **103,03**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Data/Hora Geração Boleto: 17/12/2025 17:48:45

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (CPF 513.918.569-53)
RUA ANTONIO CORREIA PINTO, 542, AP 301 - CENTRO - CORREIA PINTO - SC CEP: 88535000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica
